


## Byggerapport – nr3, Rwanda – HUS 3

Siden forrige rapport ved utløpet av mars har det skjedd en god del på tomta i



Kayonza. Veggene kom opp i første del av måneden samtidig som stål til tak-konstruksjonen ankom byggeplassen.

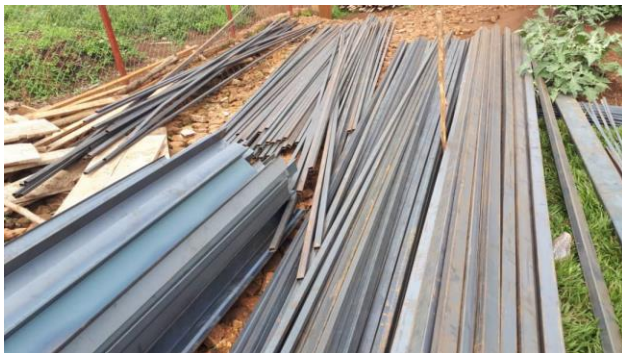

I siste del av måneden har takkonstruksjonen blitt montert så nå begynner det virkelig å ta form. Arbeidet har blitt noe forsinket som følge av periodisk mye regn.





**Monteringen av taket skjer i henhold til godkjente tegninger, selv om ikke det kan sies at HMS'en er slik vi gjerne skulle ha sett den. Heldigvis er det ikke rapportert om skader så langt.**



**1/5.2019**
